工　事　工　程　表（月間）

工事名	令和６年度 中ノ口川広域河川一級（大規模特定）塩俵橋右岸取付道路工事

出来高（9月度）		出来高（10月度）	
計画	46.0%	計画	(82.0) %
実施	41.0%	実施	

工期		
着工	令和7年4月7日	
竣工	令和7年11月27日	

工事区分	数量	月構成率
計画・準備工		
準備工	1.0 式	7.0%
築堤・護岸工		
河川土工		
掘削工	290.0 m3	0.5%
盛土工	1825.0 m3	3.5%
法面整形工	2600.0 m2	11.0%
道路改良工		
道路土工		
掘削工	4100.0 m3	3.5%
路体盛土工	1700.0 m3	8.5%
路床盛土工	880.0 m3	2.0%
法面整形工	2350.0 m2	5.5%
法面工		
植生工	1410.0 m2	6.5%
擁壁工		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	18.0 m	2.0%
排水構造物工		
PU型側溝工	194.0 m	4.0%
自由勾配側溝工	94.0 m	4.5%
集水桝工	2.0 基	0.5%
階段工		
階段工	1.0 式	2.5%
構造物撤去工		
構造物取壊工	1.0 式	0.5%
仮設工		
工事用道路工	1.0 式	2.0%
作業ヤード整備工	370.0 m3	2.0%
交通管理工		
交通誘導	1.0 式	4.5%
舗装工		
舗装工		
下層路盤工	1907.0 m2	3.0%
縁石工		
縁石工	51.0 m	1.5%
防護柵工		
路側防護柵工	228.0 m	6.0%
防止柵工	49.0 m	2.0%
防護柵基礎工	134.0 m	12.0%
道路付属施設工		
道路付属物工	23.0 本	1.0%
雑　工		
跡片付・書類整理	1.0 式	4.0%

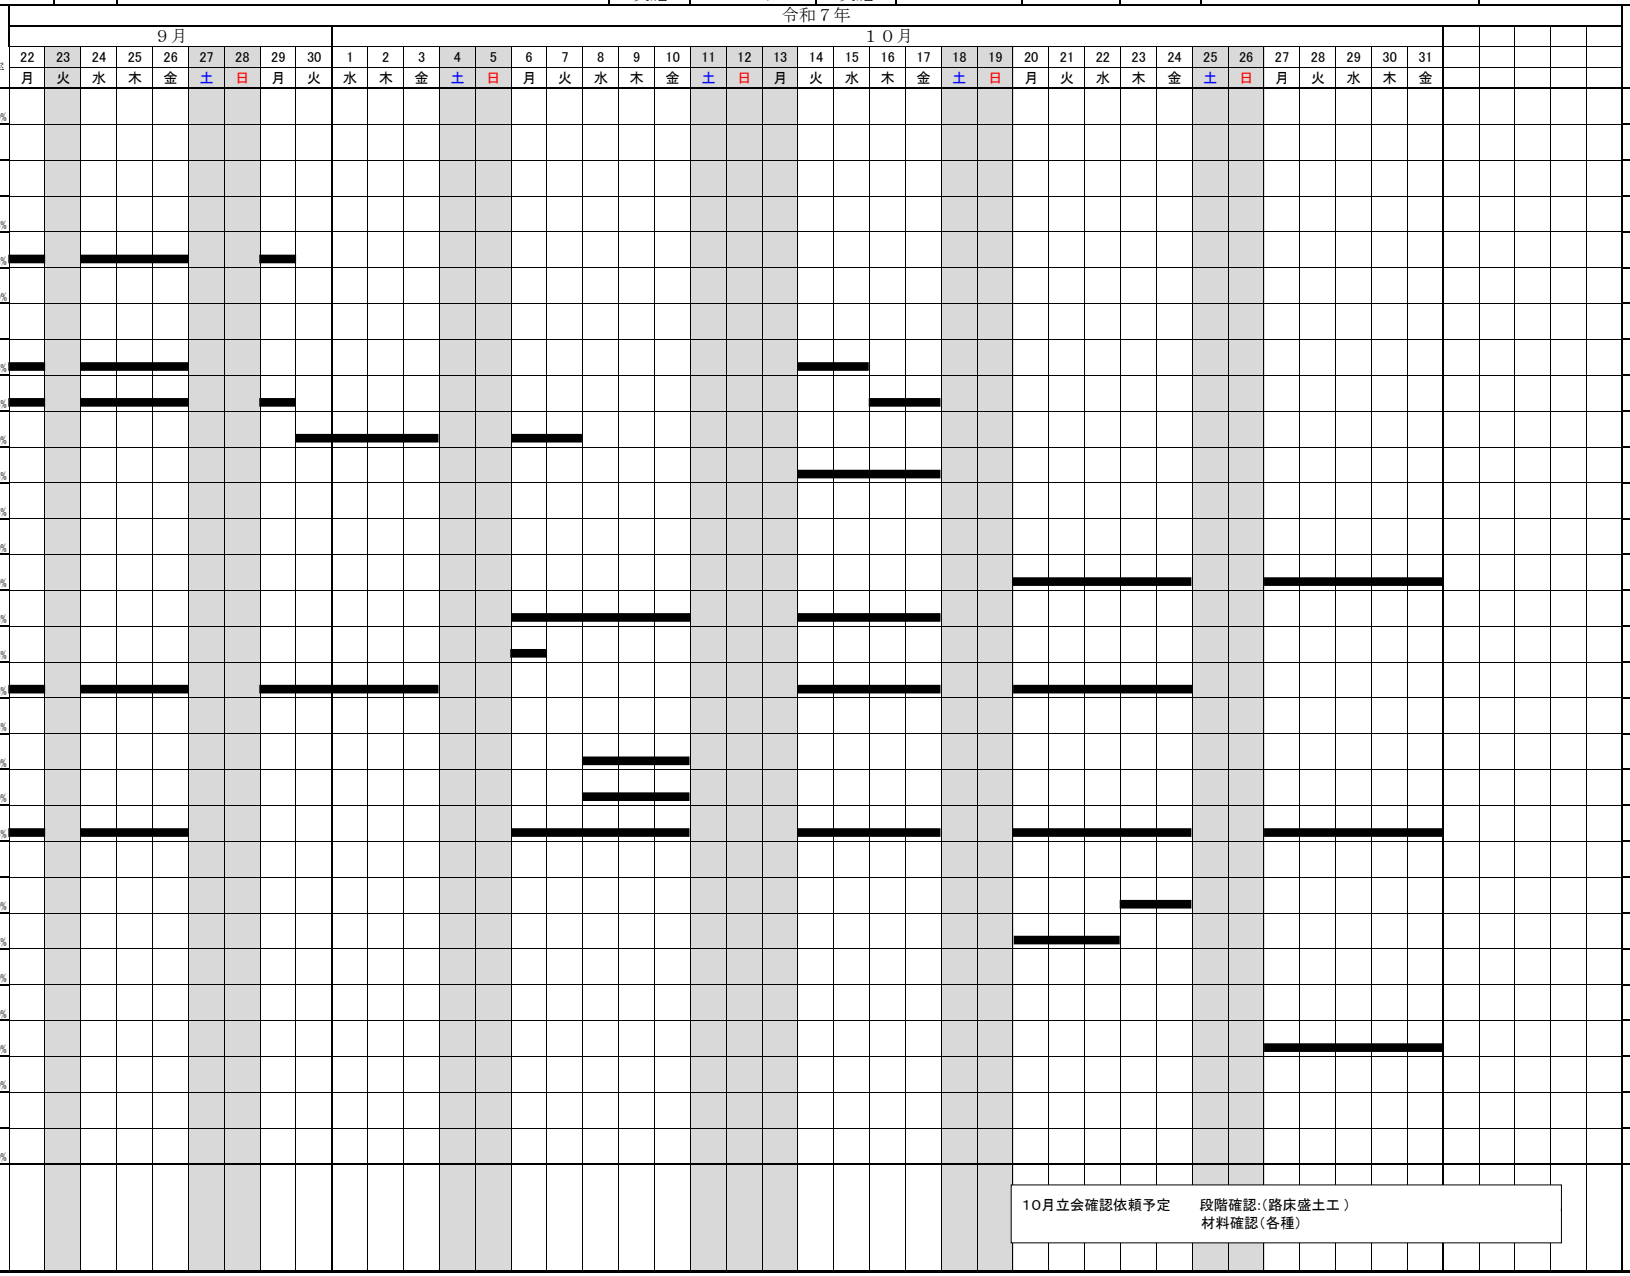

備考

株式会社　本多建設
